

LAY-OUT DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

OBRAS: SERVIÇOS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA BR-222


EXTENSÃO: 4,38 Km

TRECHO: ROTATÓRIA BR-155 / PONTE DOM ELISEU

DATA: 08/10/2024

(A) - CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE VIVÊNCIA NO CANTEIRO DE OBRAS

Item	DISCRIMINAÇÕES	Comp. (m)	Larg. (m)	QTD.	Área (m²)	Custo (R\$/m²)	TOTAL PARCIAL
A - 01	Escritório para Engº da Obra / Sala de Engenharia	4	3	1	12		R\$ -
A - 02	Administração	5	2	1	10		R\$ -
A - 03	Fiscalização	4	4	1	16		R\$ -
A - 04	Almoxarifado	6	4	1	24		R\$ -
A - 05	Laboratório	5	5	1	25		R\$ -
A - 06	Sanitário/Chuveiro	9	5	1	45		R\$ -
A - 07	Vestiário	9	4	1	36		R\$ -
A - 08	Guarita	4	3	1	12		R\$ -
A - 09	Lavagem e Manutenção	10	4	1	40		R\$ -
A - 10	Usina de Asfalto	6	24	1	144		R\$ -
SOMATÓRIO PARCIAL					364		R\$ -

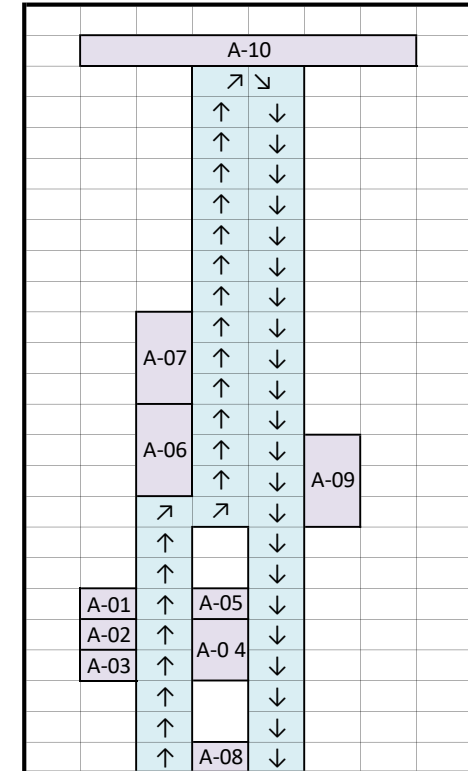


(B) - SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA BÁSICA NO CANTEIRO DE OBRAS

Item	DISCRIMINAÇÕES	UND.	QTD.	R\$/UNIT.	Parcial
B - 01	Desmatamento mecânico c/trator D-6	m²	0,00		R\$ -
B - 02	Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m	Und.	47,00		R\$ -
B - 03	Limpeza de terreno - raspagem mecanizada (motoniveladora) de camada vegetal	m²	0,00		R\$ -
B - 04	Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura (Incl.Indenização de Jazida)	m³	0,00		R\$ -
SOMATÓRIO PARCIAL					R\$ -

TOTAL GERAL

R\$ -

DIMENSÕES:  m
